


FB GS-11 TMO Prüfprotokoll GS Festigkeit PHI Sola 26

Prüf-Nr	033289-GSFest-914-reiner
Prüfdatum	22.09.2021
Prüfungsort	Grafenaschau
Muster	PHI Sola 26
Seriennummer Muster	PHI_Sola 26_22_09_2021_12_26
Prüfungsart	GS Festigkeit
Auftrag	7759
Auftraggeber	Papesh GmbH
Prüfrichtlinie	LTF NFL HG/GS 2-565-20; EN 926-1:2015
Prüfer	Brunn
Ergebnis	Bestanden
Fakturieren zu	100 %
Besonderheiten (technisch)	

22.09.2021



Datum / Unterschrift (Brunn)

Ergebnisse GS Festigkeit

Last Soll [daN]	1.036,0
Max Last [daN] über 3 sec:	1.244,0
Peak-Last [daN]	1.538,0
Messunsicherheit (MU) der gesamten Anlage:	Besser 1%
Messunsicherheit [daN]:	12,4
Max Last [daN] über 3 sec – Messunsicherheit (MU)	1.231,6
Tuchmaterial Obersegel	NCV Skytex 27
Tuchmaterial Untersegel	NCV Skytex 27
Bemerkung zur Prüfung	Die erreichte Last bezieht sich ausschließlich auf das geprüfte Muster

Prüfbedingungen

Temperatur [°C]	17
Luftdruck [hPa]	970
Luftfeuchtigkeit [%]	55

Messtechnik


Kraftmessdose:	Sensortronics Kraftaufnehmer Ser. # 794452 und #794454
Messverstärker:	Fa. Schmidtler ser# SCH10-D02
Software:	DHV FeTeGS V3.0
Letzte Kalibrierung:	14.06.2021

Deutscher Hängegleiterverband e.V.

DHV-Musterprüfstelle, Am Hoffeld 4, 83703 Gmund a.T.
 Akkreditierte Musterprüfstelle für Hängegleiter und Gleitsegel,
 D-IS-19459-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012-07



Messkurve

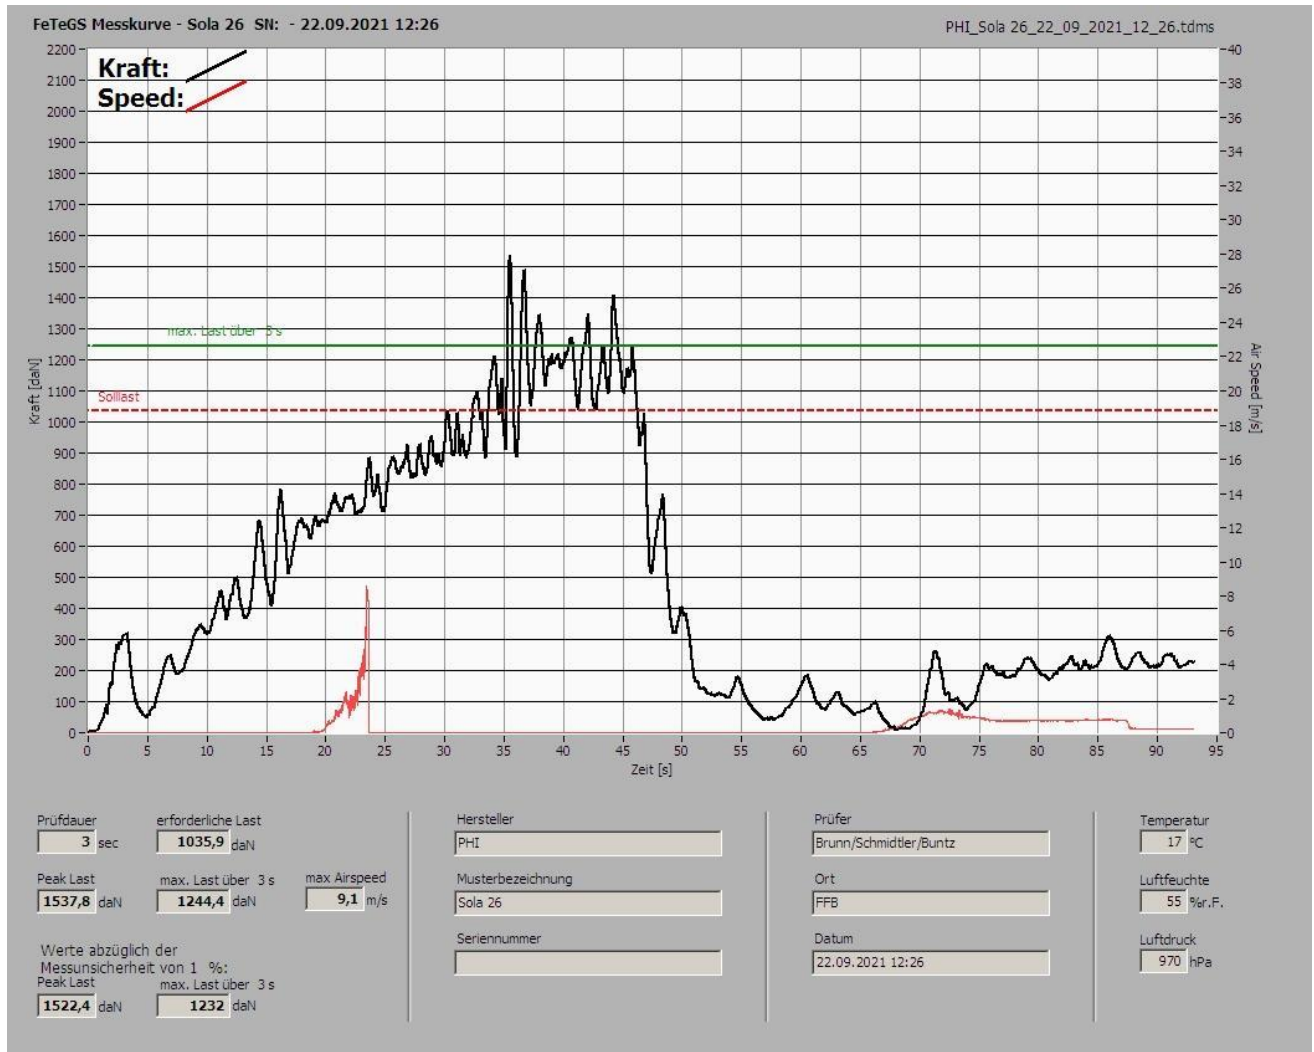

Verteiler:	Geräteakte Antragsteller Rechnungsstellung	Kopien verteilt am	
		von	
